

2012年7月9日

ロールチュルッ小学校建設 中間報告書（第3期）

ASAC プノンペン事務所

調整員 浦田 富貴美

所在地 コンポンチャム州プレイチャー郡バライ地区ロールチュルッ村
仕 様 1棟3教室 標準スタイル
付帯工事 トイレ、ドナープレート、国旗掲揚台、校門、ポンプ式井戸

1. 視察日 2012年6月28日
2. 最近の天候状況 6月：毎日、午後もしくは夕方から雨
3. 工事の進捗

期	項目	予定月	実施月	備考
第0期				
	用地の確認	2010年 11月	11月7日	
	住民集会	2012年 3月	2012年3 月29日	
	着工式	3月	3月29日	
第1期				
	基礎杭打設	4月	4月	
	基礎	4月	4月	4月10日村人が土入れを手伝う（村から約70名）
	地中梁	4月	4月	
	埋め戻し、突き固め	4月	4月	
	床のコンクリート打設	4月	4月	4月30日現地視察
第2期				
	柱	5月	5月	
	壁、扉、窓、換気ブロック	5月	5月	
	屋根の梁	5月	5月	5月23日エンジニアから第2期終了報告を受ける。
第3期				
	屋根瓦	5月	5月	5月29日現地視察
	塗装	6月	6月	
	備品の取り付け	6月	6月	6月28日現地視察
	清掃	6月		

4. 工事関係者の話

- ・作業員 21 人（女性 6 名）、6 月 28 日現在。プノンペンからの職人 11 名（現場監督を含む）、現地採用 10 名。
- ・順調に工事は進んでいます。また、無事故で行うことができます。
- ・工事用水は、現在、ポンプ式井戸の水を使っています。
- ・雨期に入り、毎日午後から雨が降っています。しかし、午前中に作業ができるので、計画通りに 6 月末には完成予定です。
- ・黒板ではなく白板をお願いしたいとの学校からの要望で、白板を取り付けるようにしました。
- ・ドナープレートは、校門に取り付けました。
- ・6 月 28 日現在、塗装の仕上げ及び備品の塗装。教室の中は、床の落ちたセメントなどを削りスムーズにする作業中。

5. 学校関係者の話

- ・校舎が完成後に、校舎の周りに土を入れ整備をする予定です。
- ・学校建設委員会のメンバーも現地採用として一緒に働いています。完成をとっても楽しみにしています。
- ・校長先生からは校舎が完成後、教室に掲示するクメール語の表等を支援してほしいとの要望がありました。（開校式の際のお土産として配布予定です。）
- ・今回、SIPAR で購入した図書を 130 冊持参しました。前回持参した図書は、半分カバー掛けが終わっているそうです。教師が校長先生一人で、また、低学年の子どもたちしかいないため、図書のカバー掛けも時間がかかります。

6. 調整員の感想

- ・今回、図書を持参した際に、ASAC スタッフより子どもたちにどんな種類の本があるかを紹介したのち、絵本の読み聞かせを行いました。子どもたちは、絵本に吸い込まれるようにとても集中して聞いていました。教科書以外の本が手になかなか入らないこういった田舎の地域では、絵本の読み聞かせなどは、本当に意義のあることだと感じました。
- ・また、教室に掲示してもらった世界地図を紹介しました。
- ・3 回目の塗装作業中でした。ペンキの塗り方がとても厚く塗られていました。
- ・また、床の最終的な仕上げも丁寧に削りとっていました。
- ・トイレの扉の木材もしっかりとしたものが取り付けられていました。

7. 参考写真



校門



校門に取り付けられたドナープレート



校舎全体



国旗掲揚台



生徒用机と椅子の塗装作業



掲示板作成作業



手すり



教壇



窓



教室の中の様子



床の様子



床をスムーズにするため削る作業



屋根の様子



校舎側面の様子



校舎裏側の様子



窓の枠と鉄格子の様子



3回目仕上げ塗装作業の様子



トイレ2室



トイレ裏側



トイレの中の様子



校舎側面の様子



校門（裏側）と井戸の様子




古い校舎で学ぶ子どもたち



ASAC スタッフが本の紹介
みんな立ちあがって見ている



本の紹介を見ている子どもたち

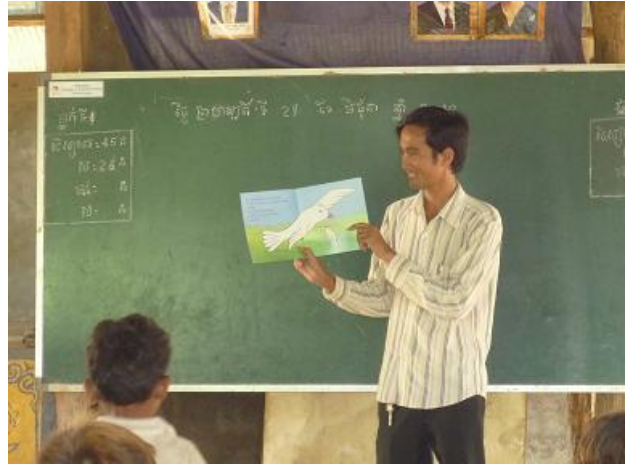

ASAC スタッフによる絵本の読み聞かせ



集中して絵本の読み聞かせを聞く子どもたち



世界地図を使ってカンボジアと日本の位置の紹介



校長先生へ図書の贈呈

以上

1.
